

96 年屏東縣政府補助辦理改善無障礙校園環境補助案  
成果報告書

填報單位：屏東縣南州鄉溪北國小  
填報人：楊秀珠  
填報日期：96.11.05

96 年屏東縣政府補助辦理改善無障礙校園環境補助案  
成果報告書

一、補助案基本資料表			
工程名稱	溪北國小殘障設施工程		
承辦單位	溪北國小	聯絡電話	08-8642081
承辦人	楊秀珠	聯絡電話	08-8642081
E-mail	Sbps2081@yahoo.com.tw		
開工日期	96 年 10 月 15 日	完工日期	96 年 11 月 6 日
工程地點	教學大樓一樓西側廁所、殘障坡道三處		
工程內容	殘障設施廁所改建，坡道重鋪		
執行效益及影響	改善無障礙教學環境，有利於行動不便之師生使用。		
原預算金額	120000 元	實際支出金額	120000 元
核定補助金額	120000 元	自籌經費	0 元
實際經費分攤情形（經費來源）			
補助單位	補助金額	補助單位	補助金額
屏東縣政府	120000 元		
附件	<input type="checkbox"/> 印刷品 式 件 <input type="checkbox"/> 報導簡報影本 份 <input checked="" type="checkbox"/> 活動照片 張 <input type="checkbox"/> 錄音帶 卷 <input checked="" type="checkbox"/> 原始支出憑證 冊 件 <input type="checkbox"/> 錄影帶 卷 <input type="checkbox"/> 其他		


單位首長： 郭棟洲

承辦人員：楊秀珠


## 成果照片



說明：拆除原有廁所改建為無障礙廁所

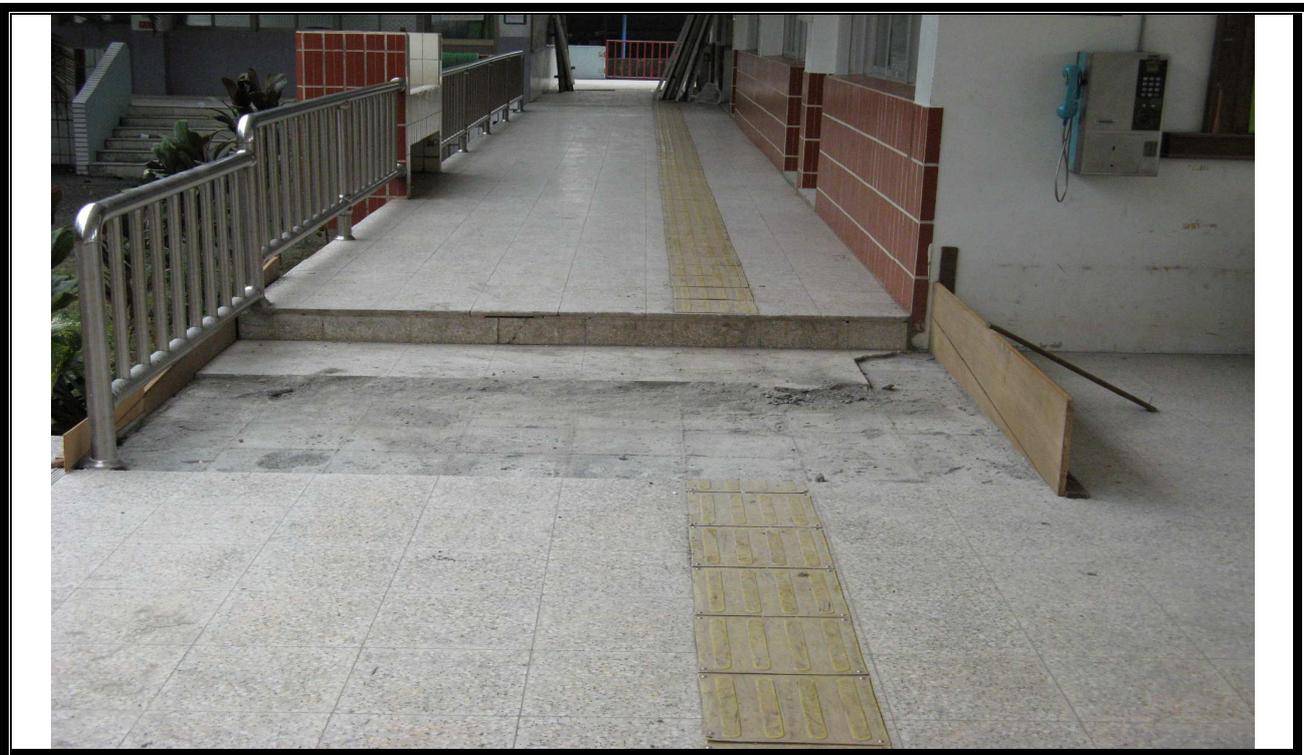

說明：殘障坡道先刨除原有地板

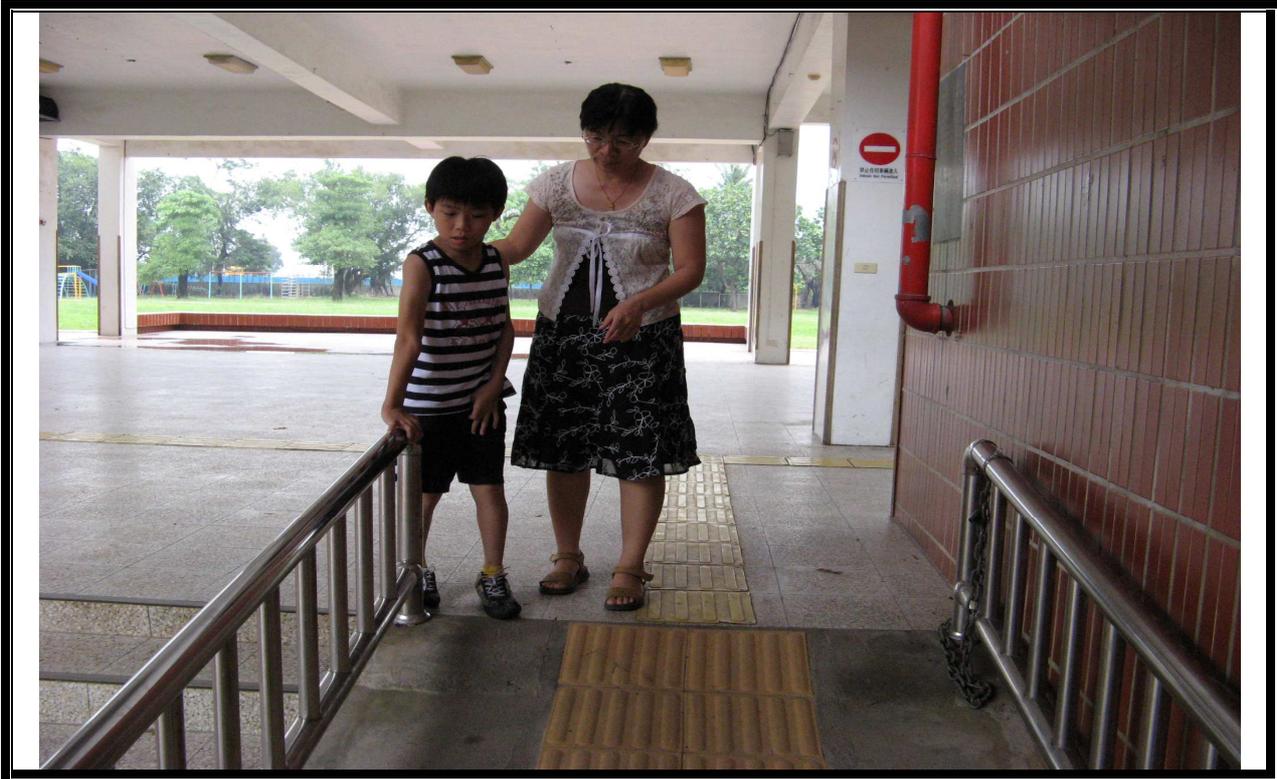

說明：施工前由老師陪同身心障礙學生勘查現有設施




說明：施工前由老師陪同身心障礙學生勘查現有設施




說明：施工前由老師陪同身心障礙學生勘查原有設施



說明：殘障坡道先刨除原有地板

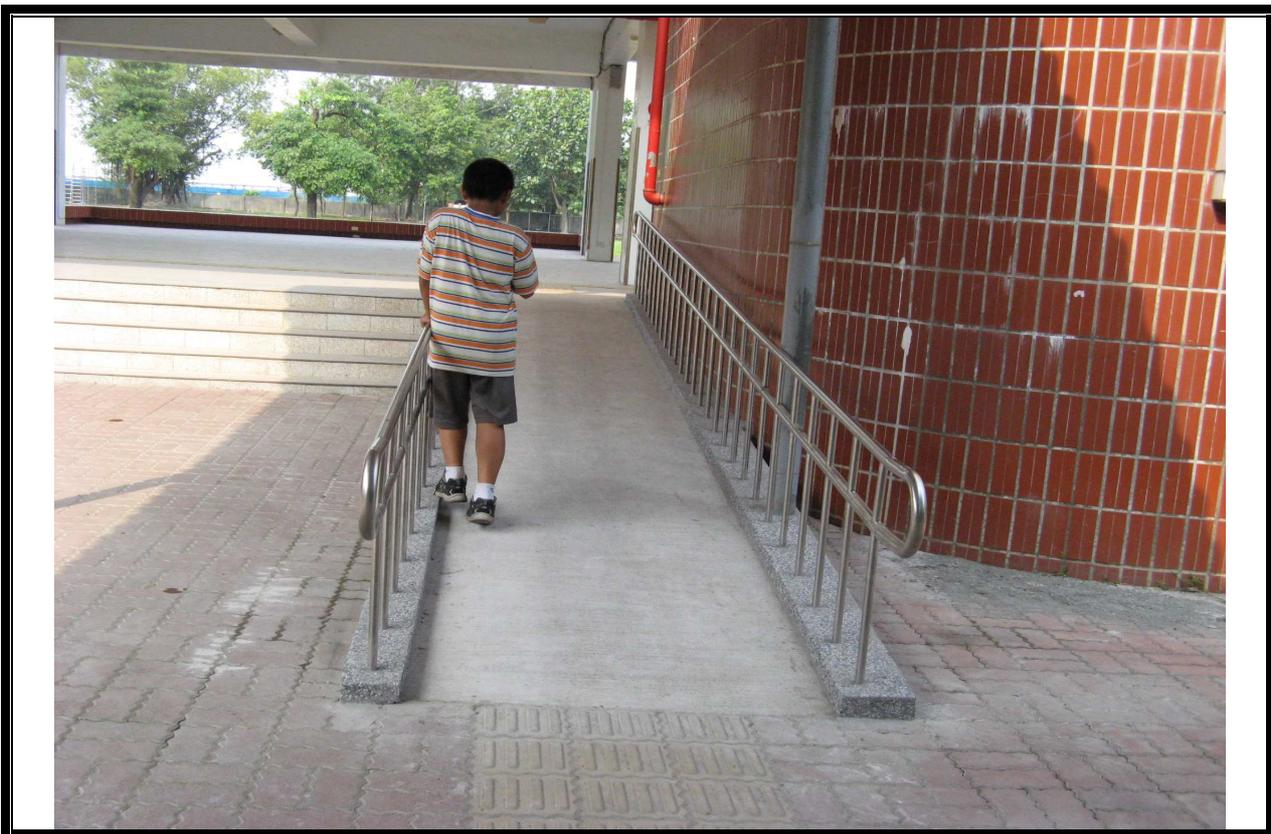

說明：施工後由學生使用改善無障礙設施

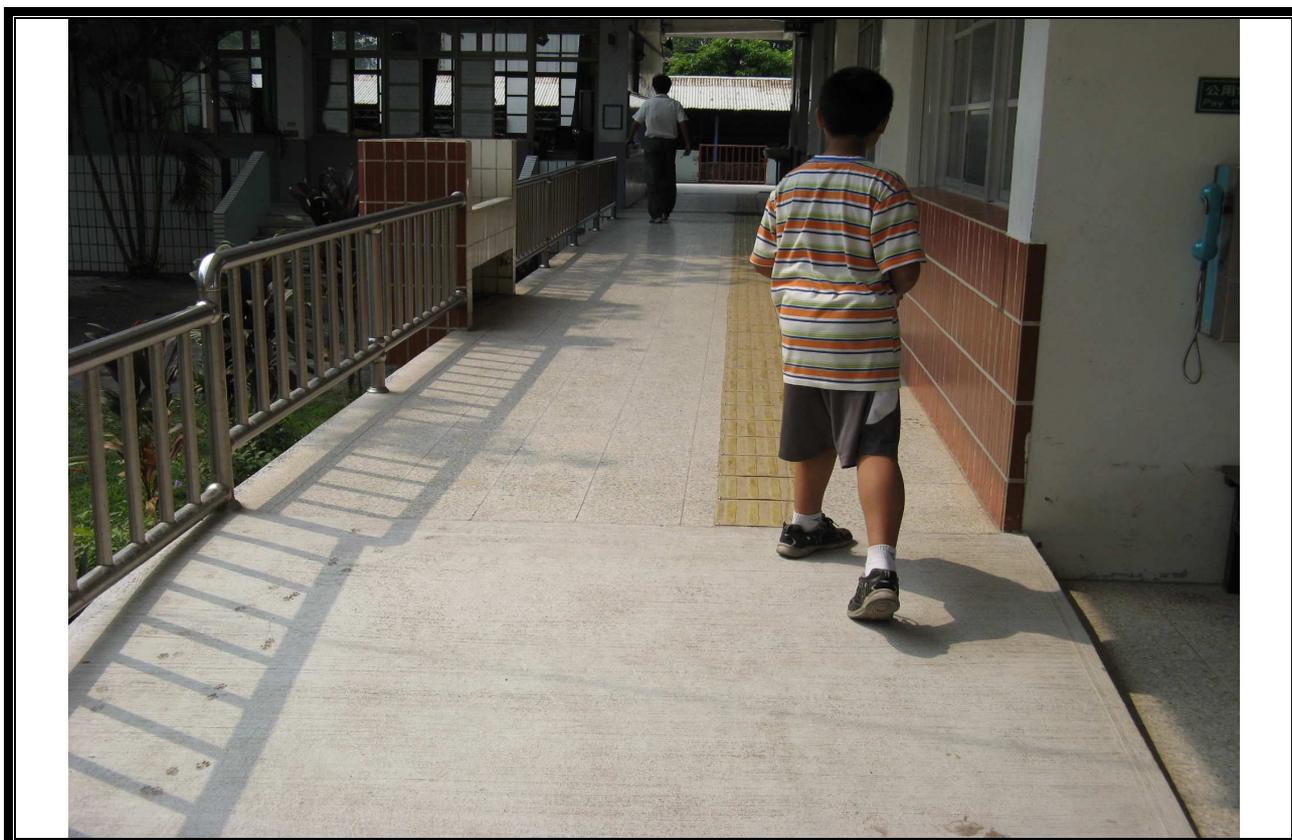

說明：施工後由學生使用改善無障礙設施



說明：施工後由學生使用改善無障礙設施



說明：施工後由學生使用改善無障礙設施
